

MUNICÍPIO: BELTERRA/PA	Agente Financeiro: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Valor Medido no Período	R\$ 40.238,64	DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023
------------------------	---	-------------------------	---------------	-----------------------------

OBJETO: INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO DE 6MM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF Sagrada Família, EMEF Santo Antônio e EMEF Enyr Ataíde BELTERRA-PA, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - LOTE 02	Agente Promotor: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Valor Medido Acumulado	R\$ 40.238,64	REFERÊNCIA	01
	CONTRATO Nº275/2023-FUNDEB Contratado: CASTRO E PESSOA LTDA	SALDO	R\$ 119.751,36	JUL/AGO/SET 2023	

ITEM	SERVIÇOS	UN.	CONTRATO			QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)				INDICADOR GERENCIAL (%)		
			Quant.	P. Unit.	P. Total	Acumul. Anterior	Medido Período	Acumul. Total	Saldo	Acumul. Anterior	Medido Período	Acumul. Total	Saldo	Acumul. Anterior	Medido Período	Acumul. Total
1	ESQUADRIAS EMEF SAGRADA FAMÍLIA				61.112,52								61.112,52			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.590,89					0,00	0,00	0,00	1.590,89	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,00	189,85	759,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	759,40	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF SAGRADA FAMÍLIA	vb	1,00	831,49	831,49	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	831,49	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO LISO E 6mm				58.690,14					0,00	0,00	0,00	58.690,14	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1	Janela de vidro de correr 0,80A X 2,50L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	9,00	1.198,07	10.782,63	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	10.782,63	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.2	Janela de vidro de correr 0,80A X 3,50L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	30,00	1.564,34	46.930,20	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	46.930,20	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.3	Janela de vidro de correr 0,80A X 2,00L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	1,00	977,31	977,31	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	977,31	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	SERVIÇOS FINAIS				831,49					0,00	0,00	0,00	831,49	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF SAGRADA FAMÍLIA	vb	1,00	831,49	831,49	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	831,49	0,00%	0,00%	0,00%
2	ESQUADRIAS EMEF SANTO ANTÔNIO				40.238,64								0,00			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.582,50					0,00	1.582,50	1.582,50	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
2.1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,00	189,85	759,40	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	759,40	759,40	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
2.1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF SANTO ANTÔNIO	vb	1,00	823,10	823,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	823,10	823,10	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
2.2	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO LISO E 6mm				37.833,04					0,00	37.833,04	37.833,04	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
2.2.1	Janela de vidro de correr 0,60A X 1,60L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	56,00	675,59	37.833,04	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	37.833,04	37.833,04	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
2.3	SERVIÇOS FINAIS				823,10					0,00	823,10	823,10	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
2.3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF SANTO ANTÔNIO	vb	1,00	823,10	823,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	823,10	823,10	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3	ESQUADRIAS EMEF ENYR ATAÍDE				58.638,84								58.638,84			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.588,66					0,00	0,00	0,00	1.588,66	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,00	189,85	759,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	759,40	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF ENYR ATAÍDE	vb	1,00	829,26	829,26	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	829,26	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO LISO E 6mm				56.220,92					0,00	0,00	0,00	56.220,92	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1	Janela de vidro de correr 1,00A X 3,00L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	28,00	1.640,87	45.944,36	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	45.944,36	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.2	Janela de vidro de correr 1,00A X 1,90L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	9,00	1.141,84	10.276,56	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	10.276,56	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	SERVIÇOS FINAIS				829,26					0,00	0,00	0,00	829,26	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF ENYR ATAÍDE	vb	1,00	829,26	829,26	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	829,26	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL					159.990,00					0,00	40.238,64	40.238,64	119.751,36	0,00%	25,15%	25,15%

CONTRATANTE:	CONTRATADA:
SEMED - BELTERRA/PA Assinatura Fiscalização/Supervisão Documento assinado digitalmente	MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA:53642740200 CASTRO E PESSOA LTDA MATHEW CASTRO Engenheiro Civil - CREA 29232 D/PA

MUNICÍPIO: BELTERRA/PA

Agente Financeiro: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Valor Medido no Período R\$ 74.393,55

DATA DA EMISSÃO: 13/09/2023

OBJETO: INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO DE 6MM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF ZÉLIA BRAGA, EMEF SÃO JORGE E EMEF FREI OSMUNDO BELTERRA-PA. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 LOTE 03

Agente Promotor: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CONTRATO Nº275/2023-FUNDEB
Contratado: CASTRO E PESSOA LTDA

Valor Medido Acumulado R\$ 74.393,55
SALDO R\$ 65.496,45

REFERÊNCIA
JUL/AGO/SET 2023

01

ITEM	SERVIÇOS	UN.	CONTRATO			QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)				INDICADOR GERENCIAL (%)		
			Quant.	P. Unit.	P. Total	Acumul. Anterior	Medido Período	Acumul. Total	Saldo	Acumul. Anterior	Medido Período	Acumul. Total	Saldo	Acumul. Anterior	Medido Período	Acumul. Total
1	ESQUADRIAS EMEF ZÉLIA BRAGA				19.959,01								19.959,01			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.613,03					0,00	0,00	0,00	1.613,03	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,00	191,38	765,52	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	765,52	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF ZÉLIA BRAGA	vb	1,00	847,51	847,51	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO LISO E 6mm				17.498,47					0,00	0,00	0,00	17.498,47	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1	Janela de vidro de correr 0,80A X 3,40L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	11,00	1.528,57	16.814,27	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	16.814,27	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.2	Janela de vidro de correr 0,80A X 1,20L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	1,00	684,20	684,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	684,20	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	SERVIÇOS FINAIS				847,51					0,00	0,00	0,00	847,51	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF ZÉLIA BRAGA	vb	1,00	847,51	847,51	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00%	0,00%	0,00%
2	ESQUADRIAS EMEF SÃO JORGE				45.537,44								45.537,44			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.852,58					0,00	0,00	0,00	1.852,58	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,00	191,38	765,52	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	765,52	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF SÃO JORGE	vb	1,00	1.087,06	1.087,06	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.087,06	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO LISO E 6mm				42.597,80					0,00	0,00	0,00	42.597,80	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.1	Janela de vidro de correr 1,10A X 2,80L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	21,00	1.676,94	35.215,74	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	35.215,74	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.2	Janela de vidro de correr 1,10A X 1,60L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	7,00	1.054,58	7.382,06	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7.382,06	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	SERVIÇOS FINAIS				1.087,06					0,00	0,00	0,00	1.087,06	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF SÃO JORGE	vb	1,00	1.087,06	1.087,06	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.087,06	0,00%	0,00%	0,00%
3	ESQUADRIAS EMEF FREI OSMUNDO				74.393,55								0,00			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.801,22					0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,00	191,38	765,52	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	765,52	765,52	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF FREI OSMUNDO	vb	1,00	1.035,70	1.035,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.2	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO LISO E 6mm				71.556,63					0,00	71.556,63	71.556,63	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.2.1	Janela de vidro de correr 1,60A X 2,70L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	10,00	2.244,39	22.443,90	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	22.443,90	22.443,90	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.2.2	Janela de vidro de correr 0,87A X 1,18L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	2,00	713,10	1.426,20	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1.426,20	1.426,20	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.2.3	Janela de vidro de correr 0,90A X 1,78L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	14,00	986,46	13.810,44	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	13.810,44	13.810,44	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.2.4	Janela de vidro de correr 0,90A X 2,40L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	1,00	1.247,36	1.247,36	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.247,36	1.247,36	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.2.5	Janela de vidro de correr 1,18A X 2,40L 4 folhas vidro temperado liso e= 6mm	und	1,00	1.554,89	1.554,89	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.554,89	1.554,89	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.2.6	Esquadria basculante em vidro temperado liso e= 6mm	m²	42,88	724,67	31.073,84	0,00	42,88	42,88	0,00	0,00	31.073,84	31.073,84	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.3	SERVIÇOS FINAIS				1.035,70					0,00	1.035,70	1.035,70	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
3.3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EMEF FREI OSMUNDO	vb	1,00	1.035,70	1.035,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL GERAL					139.890,00					0,00	74.393,55	74.393,55	65.496,45	0,00%	53,18%	53,18%

CONTRATANTE: SEMED - BELTERRA/PA
Assinatura Fiscalização/Supervisão

CONTRATADA: MATHEW ANTONIO CASTRO DA SILVA:53642740200
CASTRO E PESSOA LTDA
MATHEW CASTRO
Engenheiro Civil - CREA 29232 D/PA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: ESCOLAS DE BELTERRA – PA

DATA: 27/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDROS 6MM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DARCY VARGAS, FREI FABIANO, VITALINA MOTTA, SÃO PEDRO, SAGRADA FAMÍLIA, SANTO ANTÔNIO, ENY ATAÍDE, ZÉLIA BRAGA, SÃO JORGE E EMEI FREI OSMUNDO, BELTERRA – PA.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

EMPRESA: CASTRO & PESSOA LTDA

VALOR: R\$ 440.870,00

**CONTRATO: 275/2023 FUNDEB
MUNICIPAL DE BELTERRA**

PRAZO: 120 dias

FISCAL: FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

STATUS: EM ANDAMENTO

LOTE: 02

ESCOLA EMEF SANTO ANTÔNIO

PLANENGER
ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

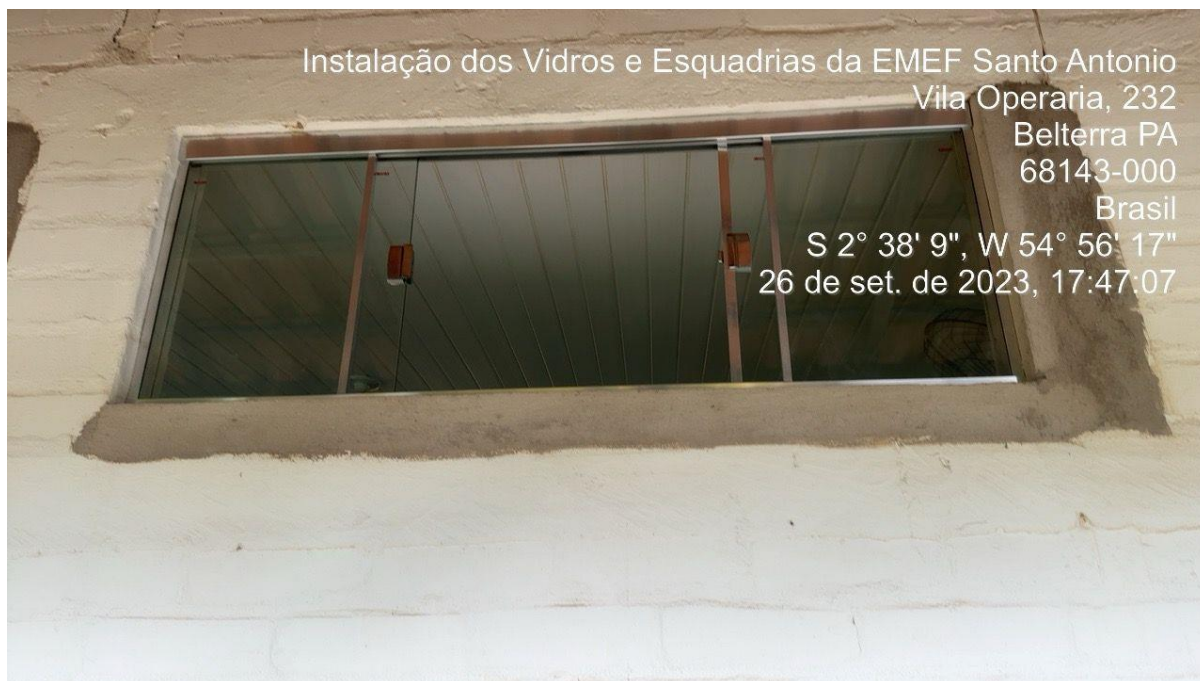


IMAGEM 01 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

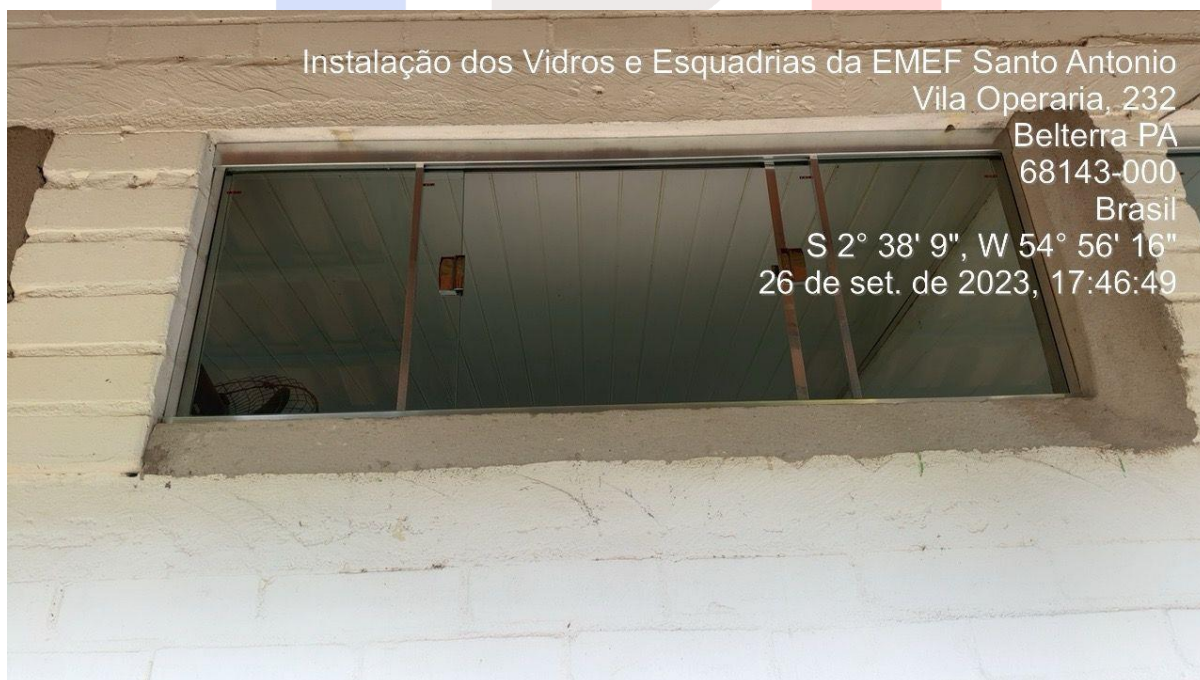


IMAGEM 02 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

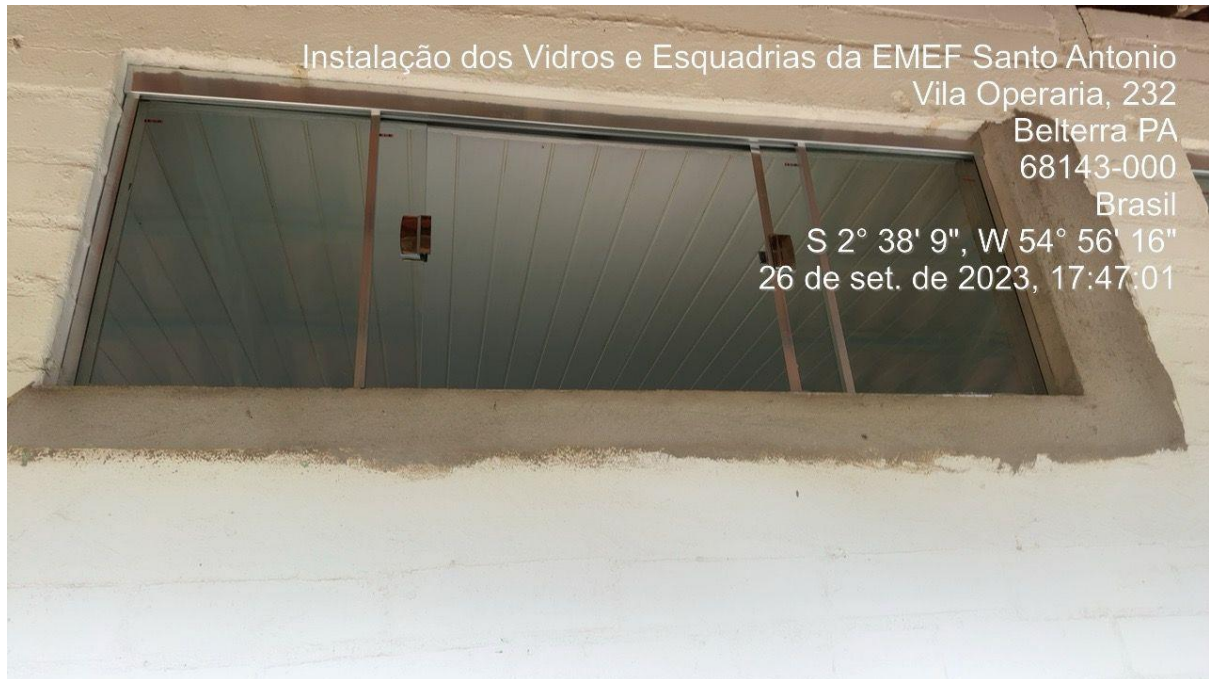


IMAGEM 03 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

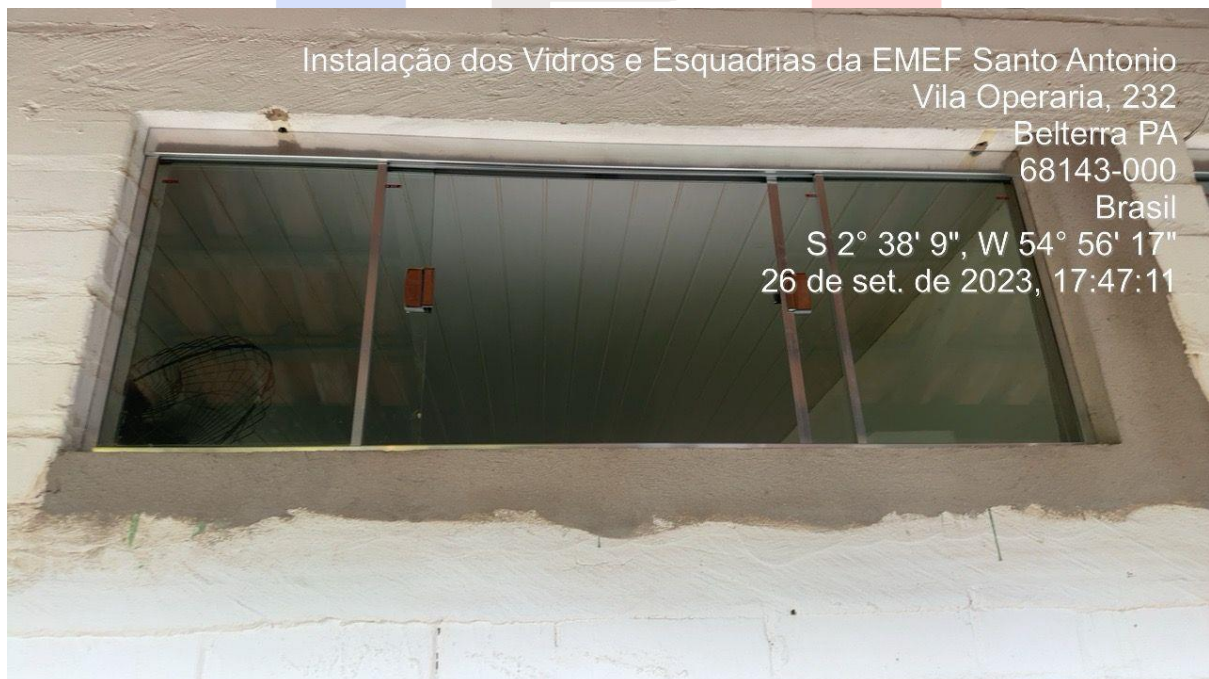


IMAGEM 04 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

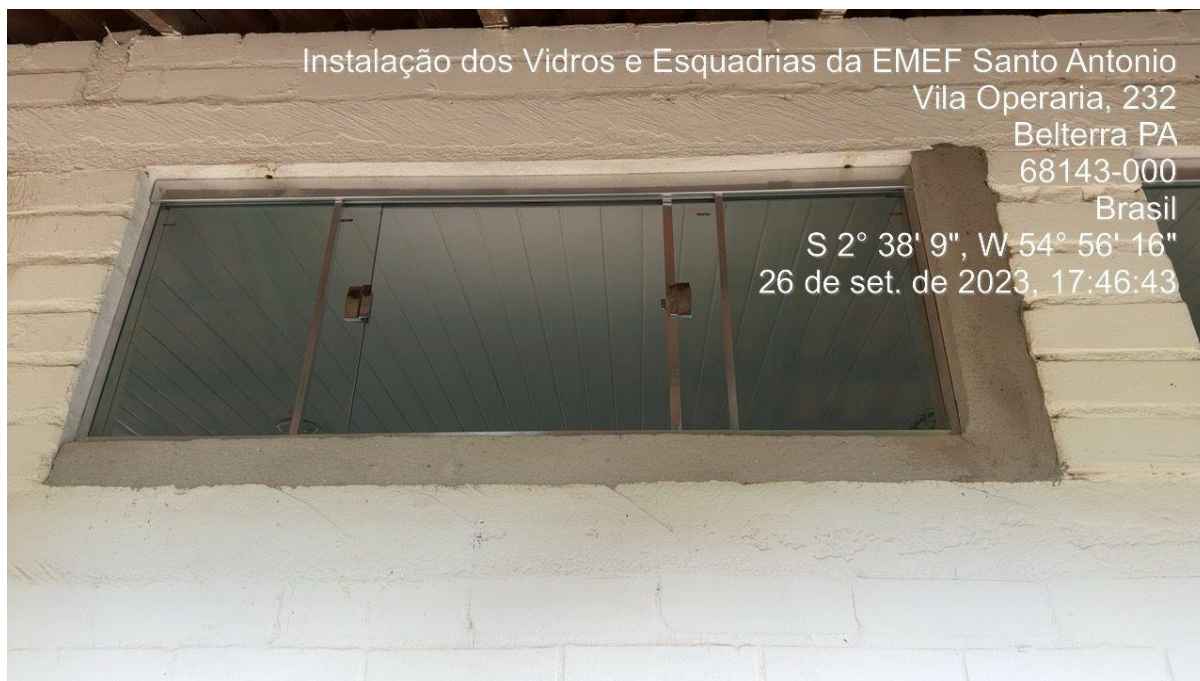


IMAGEM 05 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

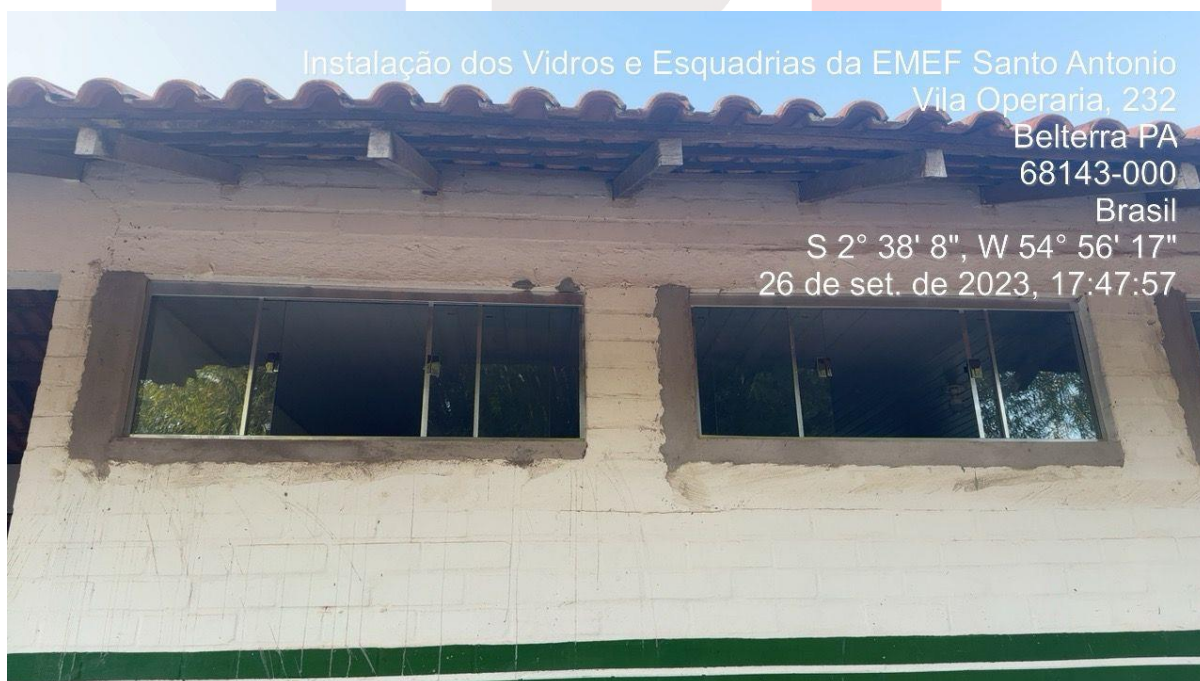


IMAGEM 06 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 07 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

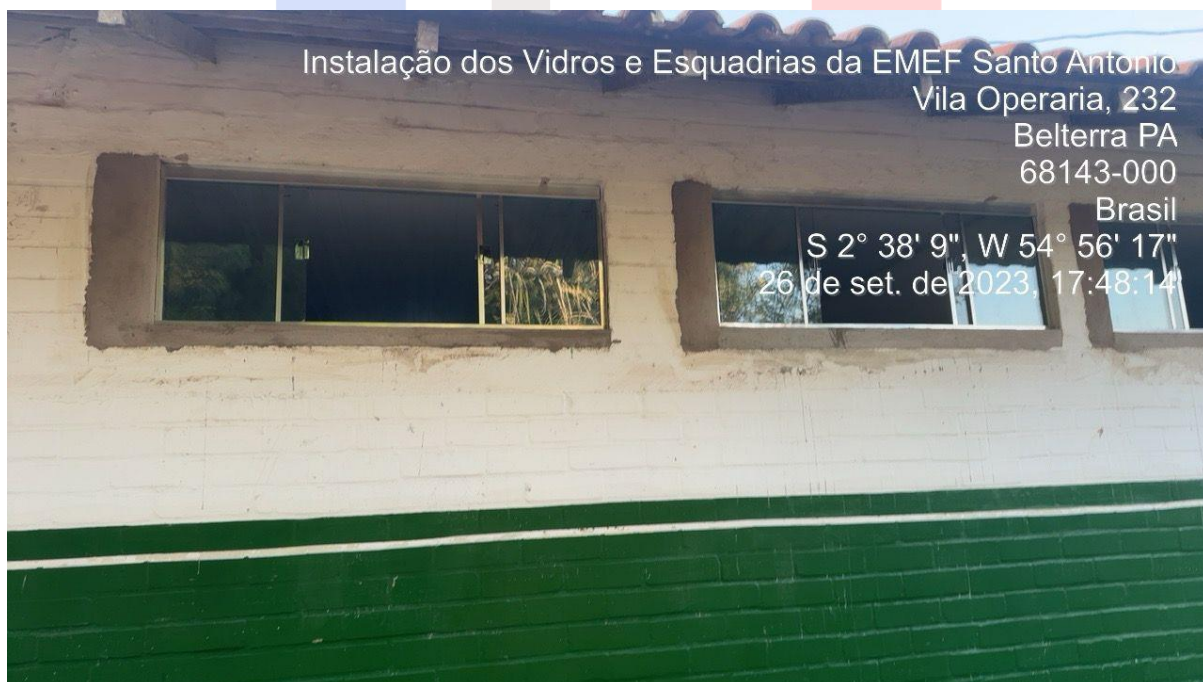


IMAGEM 08 – Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio



PLANENGER
ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM – 09 Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio



IMAGEM – 10 Instalação dos vidros da EMEF Santo Antônio

CNPJ: 19.110.167/0001-33
Inscrição Estadual: 15619825-8
Engenheiro Civil Victor Freire
CREA: 15619825-8

Endereço: Getulio Vargas S/N, Bairro: Centro, Anexo ao Posto São Matheus, Ponto G, Itaituba PA, CEP. 68180-020

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinado digitalmente por MATHEW ANTHONIO CASTRO
DA SILVA:53642740200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=
MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA:53642740200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.27 10:11:31-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**MATHEW ANTHONIO
CASTRO DA
SILVA:53642740200**

MATHEW CASTRO

Engenheiro Civil - CREA 29232 D/PA



PLANENGER
ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: ESCOLAS DE BELTERRA – PA

DATA: 27/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDROS 6MM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DARCY VARGAS, FREI FABIANO, VITALINA MOTTA, SÃO PEDRO, SAGRADA FAMÍLIA, SANTO ANTÔNIO, ENY ATAÍDE, ZÉLIA BRAGA, SÃO JORGE E EMEI FREI OSMUNDO, BELTERRA – PA.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

EMPRESA: CASTRO & PESSOA LTDA

VALOR: R\$ 440.870,00

**CONTRATO: 275/2023 FUNDEB
MUNICIPAL DE BELTERRA**

PRAZO: 120 dias

FISCAL: FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

STATUS: EM ANDAMENTO

LOTE: 03

ESCOLA EMEI FREI OSMUNDO

PLANENGER
ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

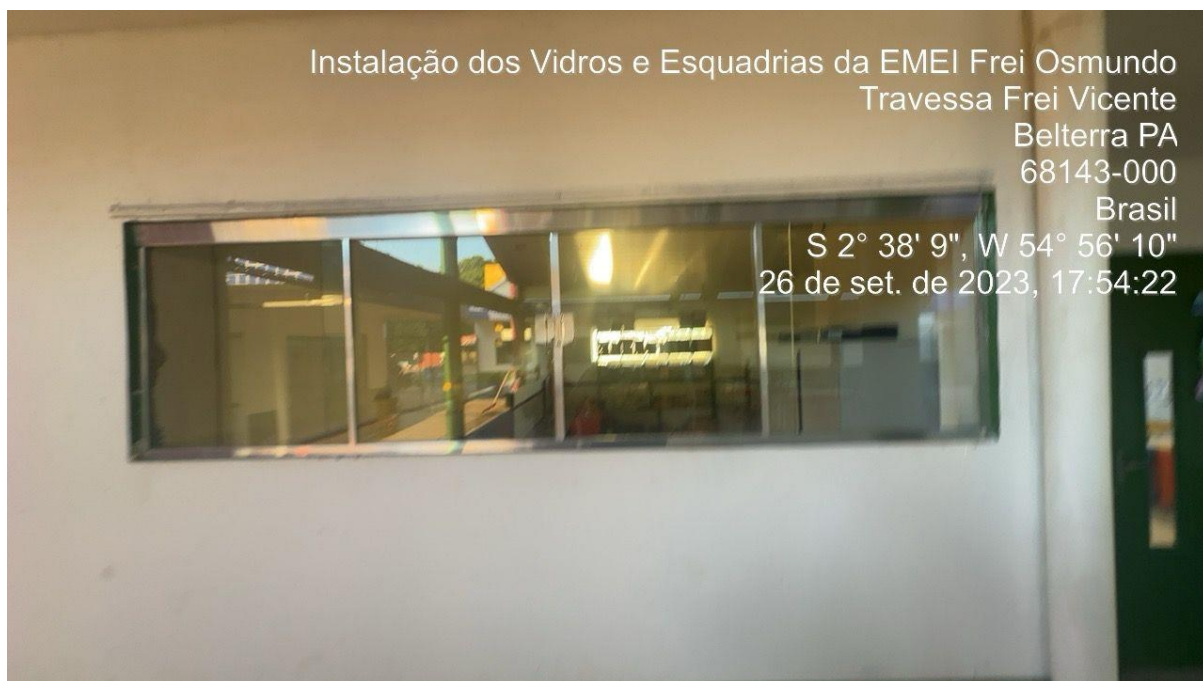


IMAGEM 01 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo

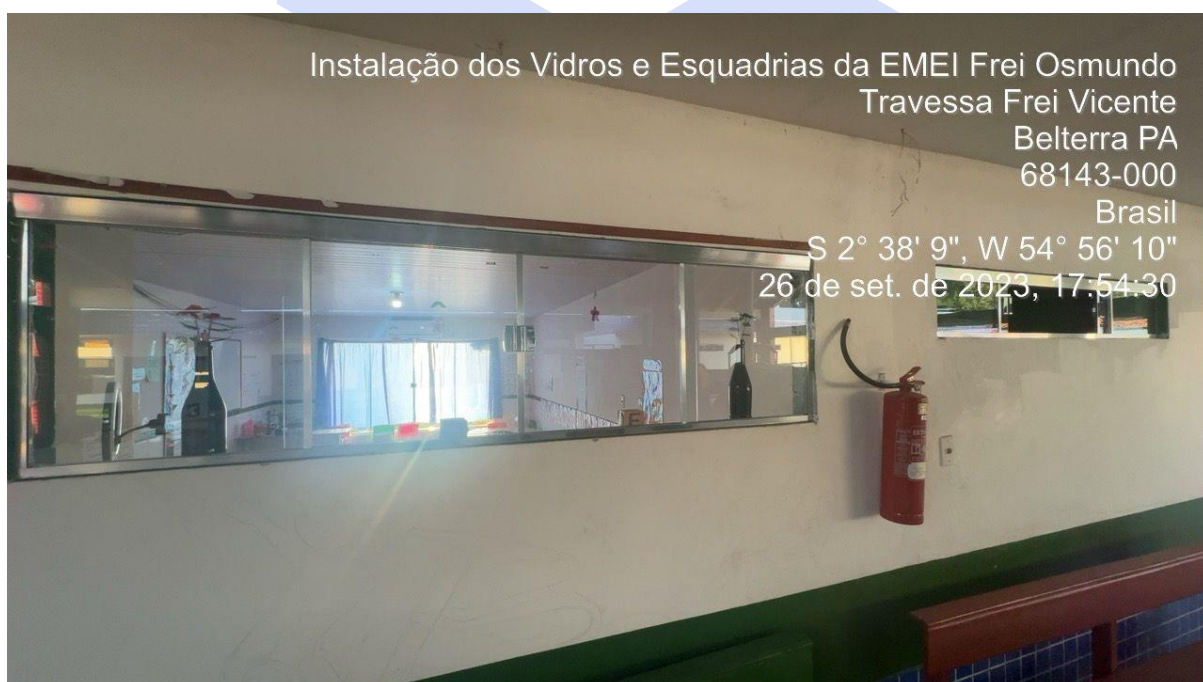


IMAGEM 02 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

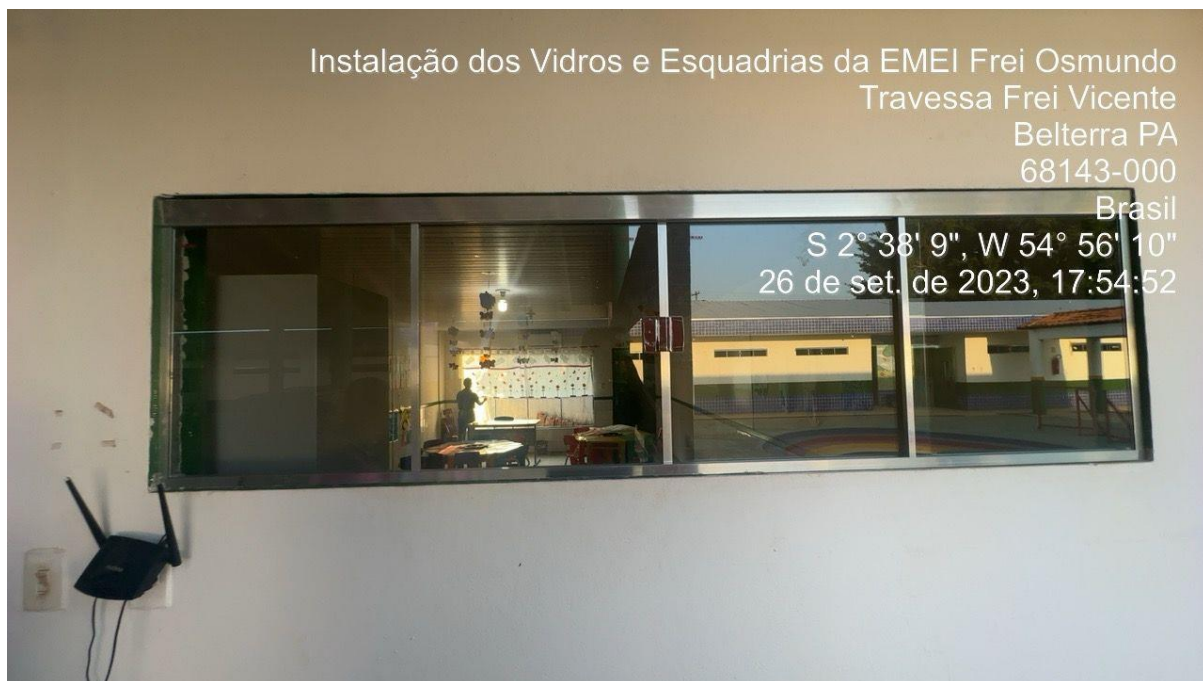


IMAGEM 03 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo

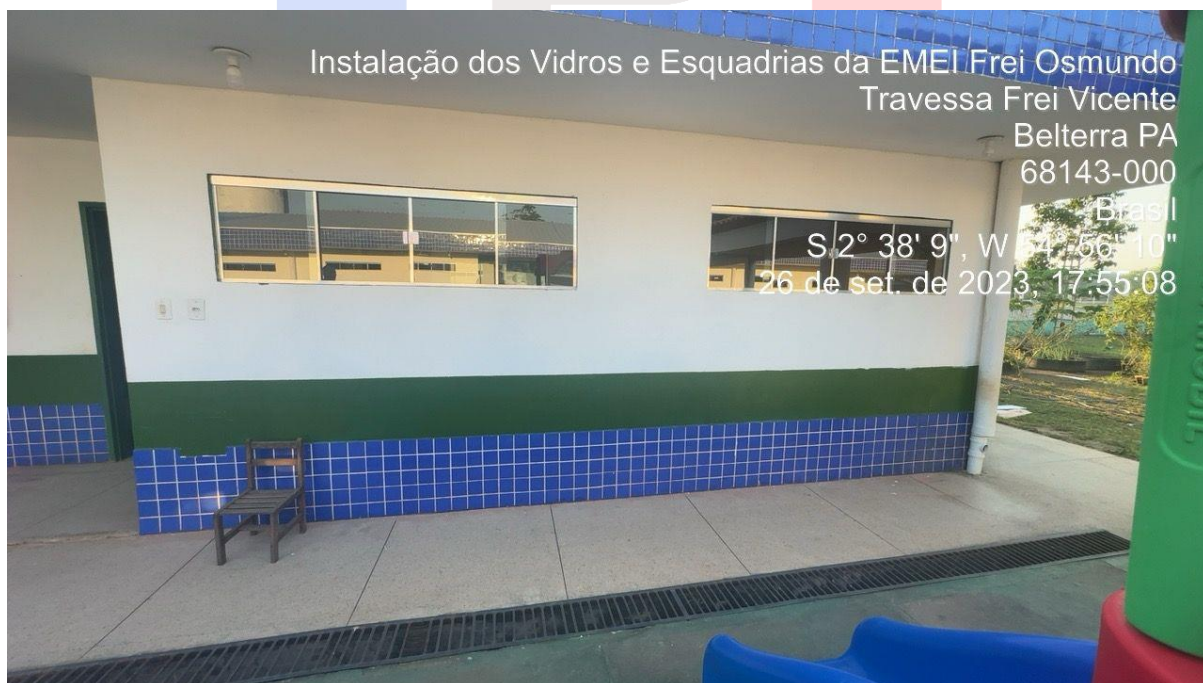


IMAGEM 04 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

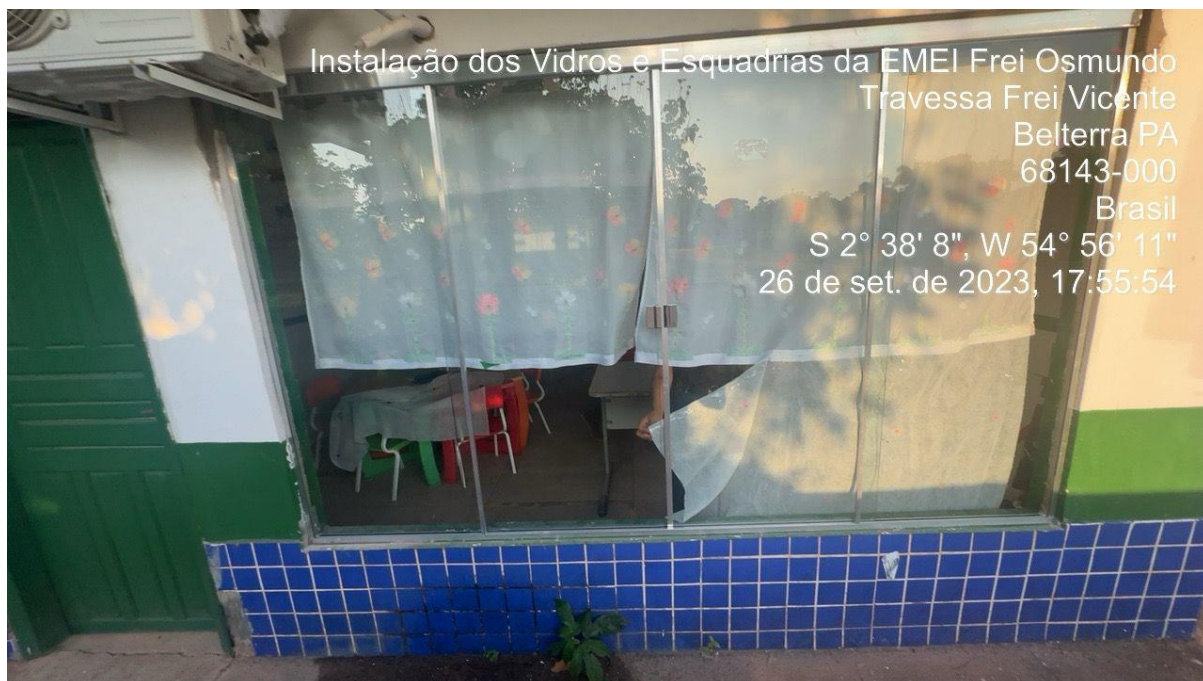


IMAGEM 05 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo



IMAGEM 06 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 07 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo



IMAGEM 08 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo



IMAGEM 10 – Instalação dos vidros da EMEI Frei Osmundo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MATHEW
ANTHONIO
CASTRO DA
SILVA:53642740200

Assinado digitalmente por MATHEW ANTHONIO CASTRO
DA SILVA:53642740200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia,
CN=MATHEW ANTHONIO CASTRO DA
SILVA:53642740200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.27 10:14:48 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

MATHEW CASTRO

Engenheiro Civil - CREA 29232 D/PA



PLANENGER
ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
DIVISÃO DE OBRAS – PMB



Memorando, nº 100/2023 – Belterra, 04 de outubro de 2023

A Secretaria municipal de Educação – SEMD

Senhora secretária, Dimaima Nayara

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO Nº275/2023-FUNDEB
VALOR GLOBAL R\$440.870,00

A PAGAR 1º MEDIÇÃO | R\$ 114.632,19

Senhora secretária, venho por meio deste encaminhar 1º medição dos serviços executados advindos do contrato nº 275/2023 – Fundeb, cujo o objetivo é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO DE 6MM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DARCY VARGAS, FREI FABIANO, VITALINA MOTTA, SÃO PEDRO, SAGRADA FAMÍLIA, SANTO ANTÔNIO, ENY ATAÍDE, ZÉLIA BRAGA, SÃO JORGE E EMEI FREI OSMUNDO, BELTERRA-PA.

Abaixo encaminho planilha de avanço físico-financeiro do respectivo contrato.

RELATÓRIO FÍSICO - FINANCEIRO CONTRATO 275/2023 - FUNDEB				
	Valor do contrato	Medido no período	Medido acumulado	Saldo do contrato
Investimento	R\$ 440.870,00	R\$ 114.632,19	R\$ 114.632,19	R\$ 326.237,81
Exec. Física	-	26,00%	26,00%	74%

Dimaima Nayara de Sousa Moura
Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Representante Tomador

Documento assinado digitalmente
gov.br JANIO PATRIK ROCHA DA SILVA
Data: 04/10/2023 11:48:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jânio Patrik Rocha da Silva
Eng. Civil
Fiscal de Obras – PMB
